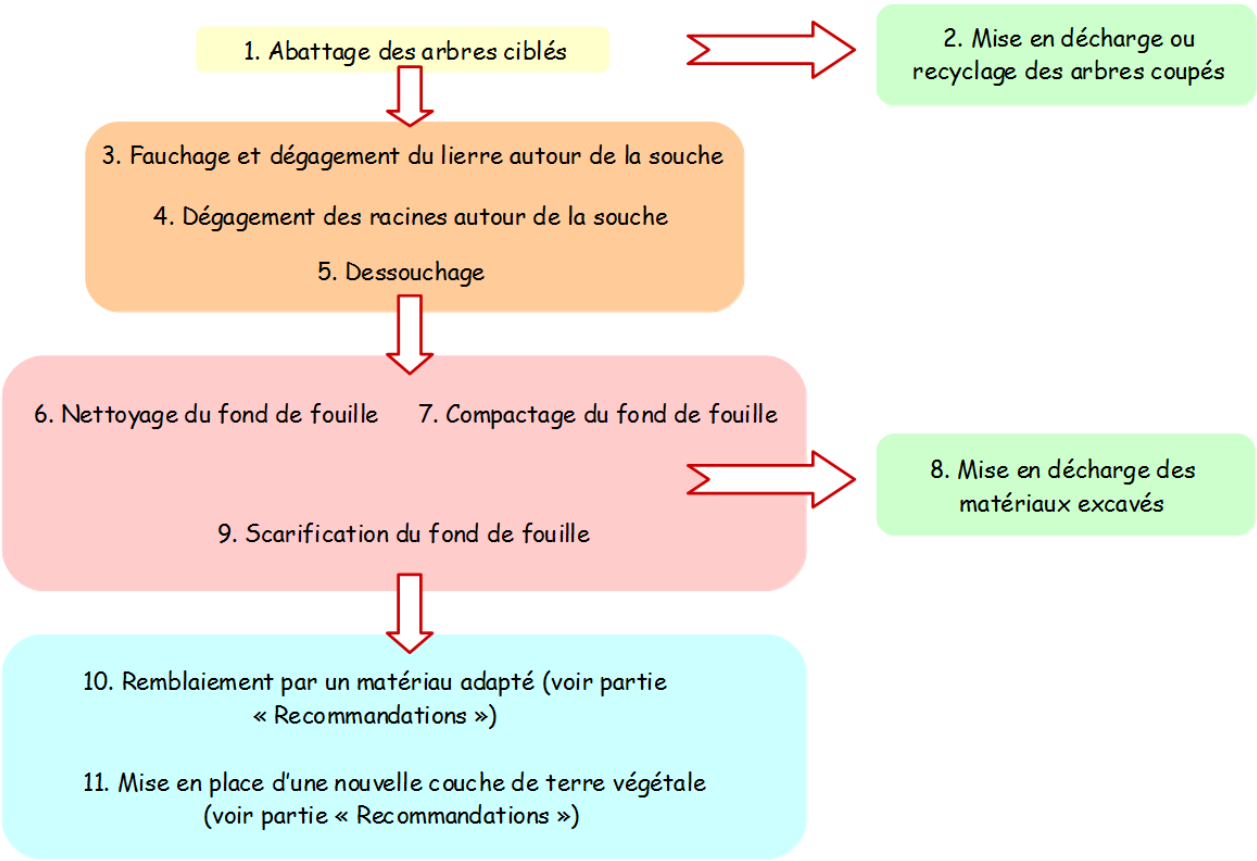
1. Abattage des arbres ciblés
2. Mise en décharge ou recyclage des arbres coupés
3. Fauchage et dégagement du lierre autour de la souche
4. Dégagement des racines autour de la souche
5. Dessouchage
6. Nettoyage du fond de fouille
7. Compactage du fond de fouille
8. Mise en décharge des matériaux excavés
9. Scarification du fond de fouille
10. Remblaiement par un matériau adapté (voir partie « Recommandations »)
11. Mise en place d'une nouvelle couche de terre végétale (voir partie « Recommandations »)
