

EST-ON CONDAMNÉS À RECONSTRUIRE VITE ET À L'IDENTIQUE ?

Apport des Retours d'Expérience à moyen et long terme sur
deux inondations du Sud de la France : l'Aude après 1999 et le
Var après 2010

Annabelle MOATTY

Chercheur associé Université de Montpellier 3

UMR GRED (Gouvernance Risques Environnement Développement)



DÉROULEMENT

- Retour d'expérience à long-terme
- Temporalités de la reconstruction
- Blocages à l'intégration d'une « éthique préventive »
- Anticipation de la post-catastrophe



RETOUR D'EXPÉRIENCE À LONG-TERME (1/2)

Décrire

Temporalités

Acteurs

Territoires

Elaborer

Grille de lecture des processus de reconstruction post-catastrophe

Analyser

« Ethique Préventive »

Relèvement des populations


Recomposition territoriale

Identifier

« Conditions favorables et facteurs contraignants »

Evaluer

« Bonnes et mauvaises pratiques »



Développer l'opportunité préventive

RETOUR D'EXPÉRIENCE À LONG-TERME (2/2)

T + 4 et 15 ans après
la catastrophe

Bureau

Revue de littérature

Bibliométrie

Cartographie

observations *in-situ*

58 entretiens

Archives

Terrain

Depuis la post-crise immédiate jusqu'au relèvement et développement




Relogement temporaire et
permanent

Évolution des dynamiques avant et
après

Principales difficultés des parties
prenantes

Ressources humaines, techniques et
économiques

PROJET RETINA

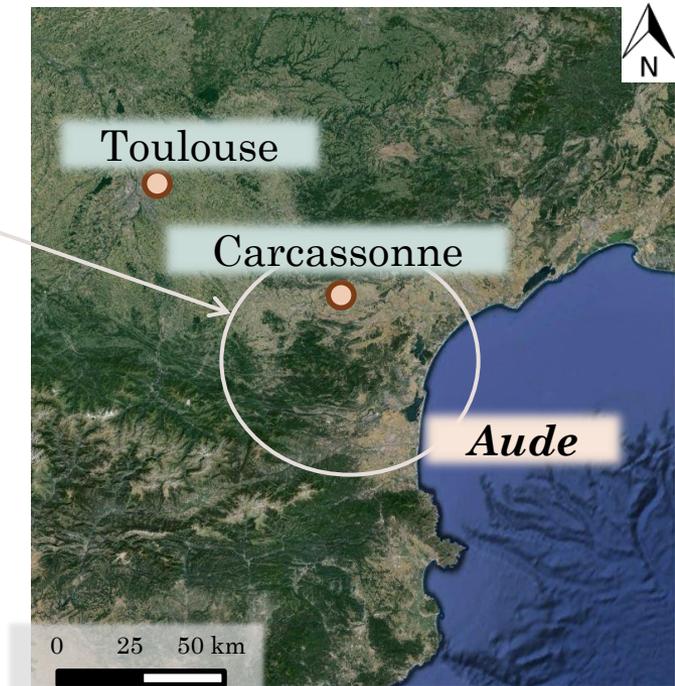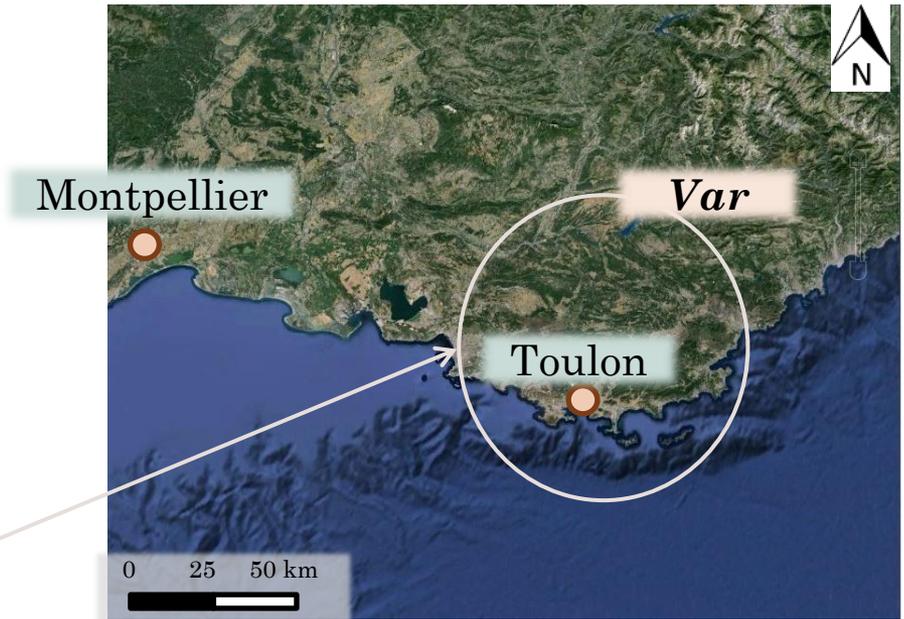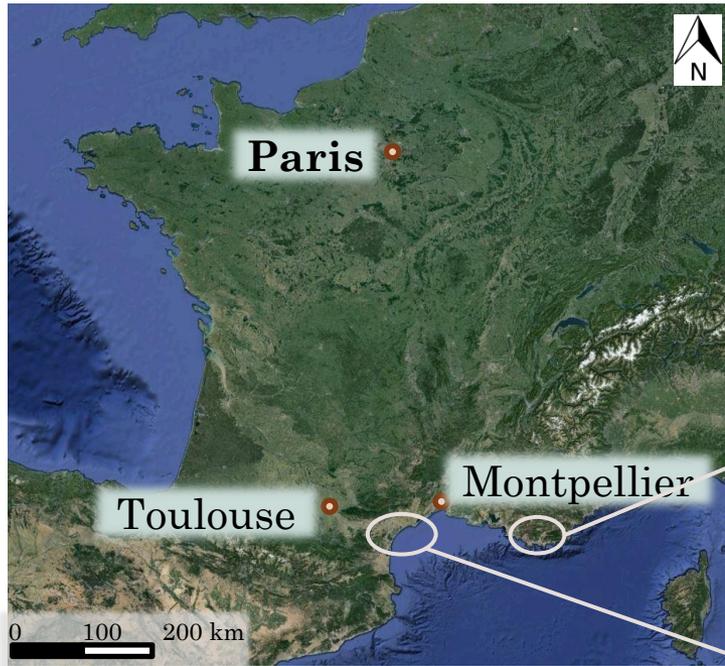


<i>Aude</i>	<i>Var</i>
<i>Inondations</i>	
12 & 13/11/1999	15 & 16/06/2010
32 entretiens	26 entretiens


TEMPORALITÉS DE LA RECONSTRUCTION

D'abord, une multitude de décisions et d'actions dans un temps limité ...

... puis, une dilution des actions de reconstruction dans les temporalités d'aménagement du territoire et de prévention

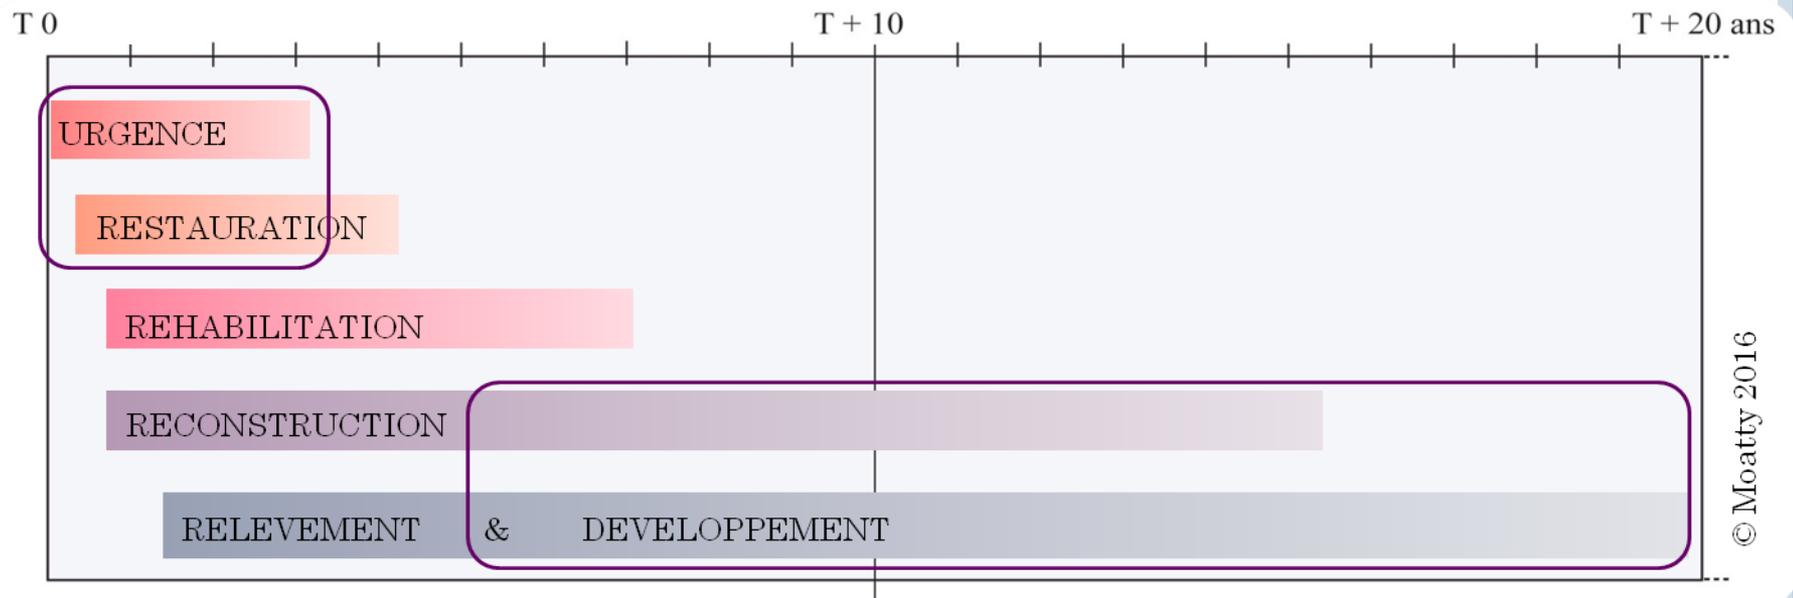

BLOCAGES À L'INTÉGRATION D'UNE « ÉTHIQUE PRÉVENTIVE »

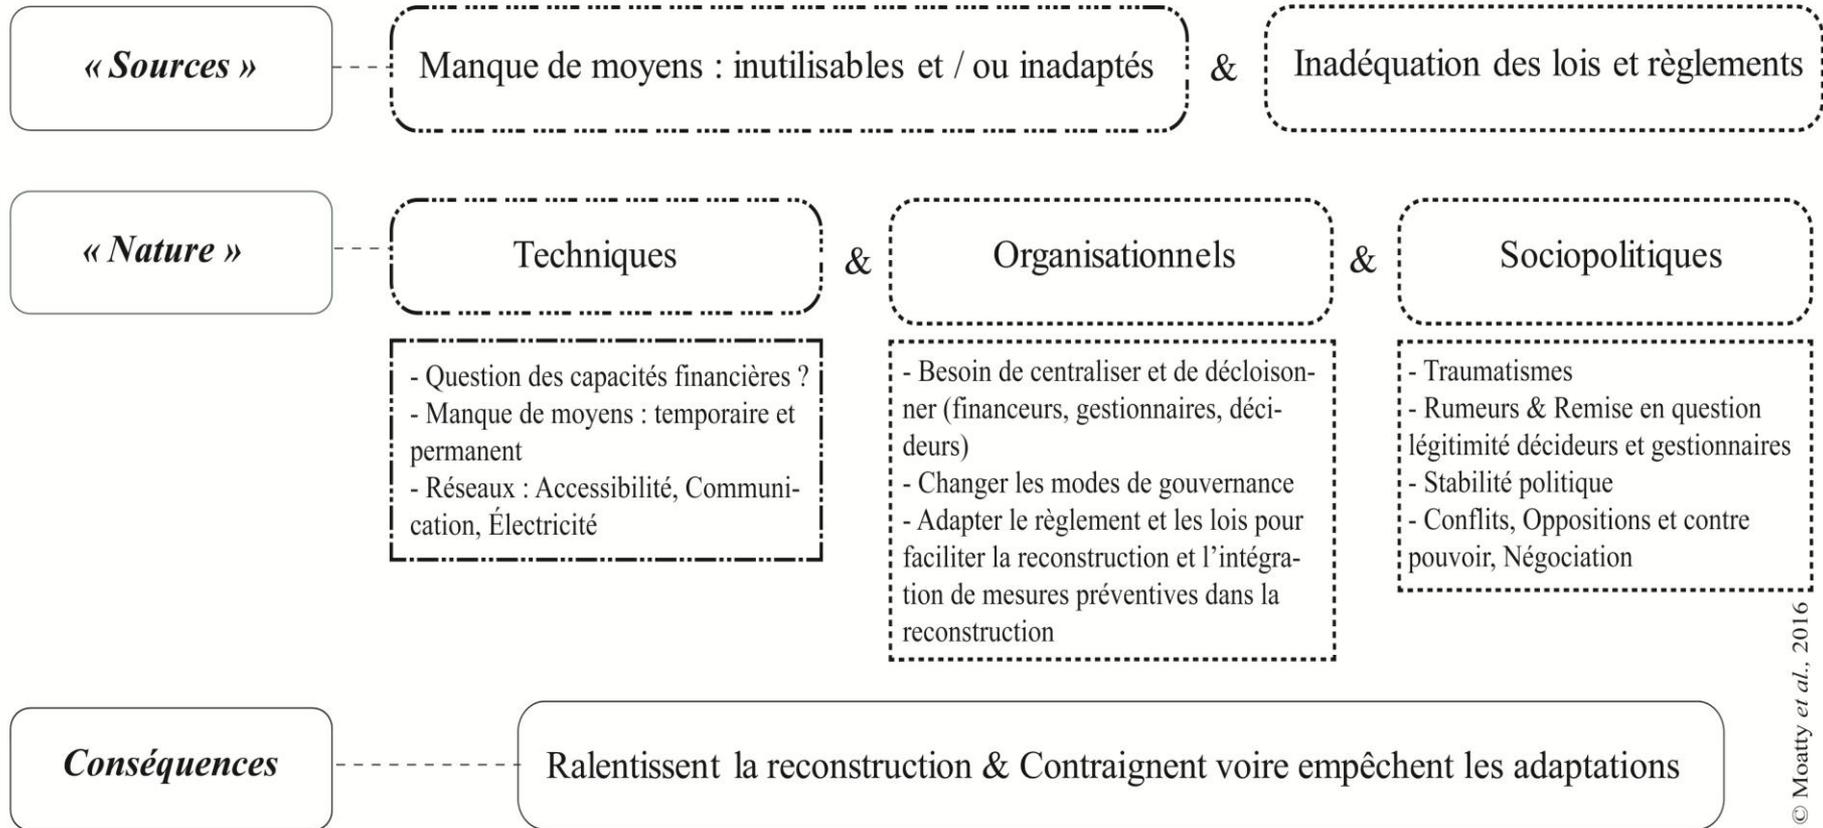

PLANS DE RECONSTRUCTION POST-CATASTROPHE

Catastrophes « Naturelles » (Tokyo, Kobe, Sendai, Fuji, Bogota) & Catastrophe Nucléaire (Disaster Mitigation Act, USA)

Portée des plans de reconstruction :

- ✧ Coordination des acteurs et identification d'un leadership
- ✧ Rapidité de mise en œuvre
- ✧ Utilisation raisonnable des fonds du développement

Limites des plans de reconstruction :

- ✧ Manquent de flexibilité (effets dominos et initiatives spontanées)
- ✧ Faible intégration des acteurs locaux, dont la société civile


Combiner *ex ante* anticipation avec planification *ex post*

Planification de la reconstruction

Permet d'améliorer les stratégies d'anticipation par les REX

- Evaluation des dommages
- Constitution et mobilisation de la CIR (de la programmation au suivi)
 - Programmation des crédits et travaux
- Adaptation des mesures préconisées dans les plans, etc.

ANTICIPER LA POST- CATASTROPHE

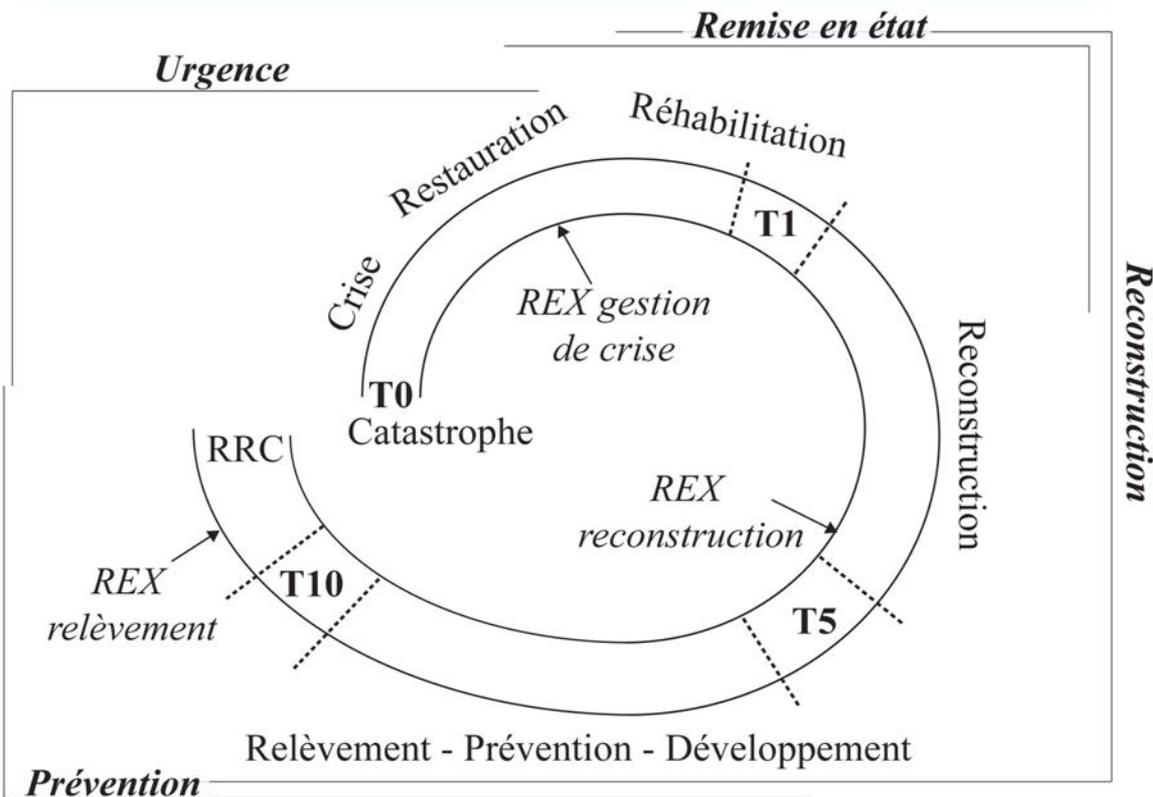


Anticipation de la reconstruction

Facilite la reconstruction et sa planification

- Elaboration de scénarios
- Stratégies de relogement temporaire et permanent
 - Structuration d'une CIR
- Adaptation du cadre légal et réglementaire, etc.

© Moatty 2016

Issu de A. Moatty, (2015). Pour une Géographie des Reconstructions post-catastrophe : Risques, Sociétés et Territoires . Géographie. Université Paul Valéry - Montpellier 3. 491 p. Français. [tel: 01283718](https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01283718)



amoatty@yahoo.fr

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

